
Vorschlag 1

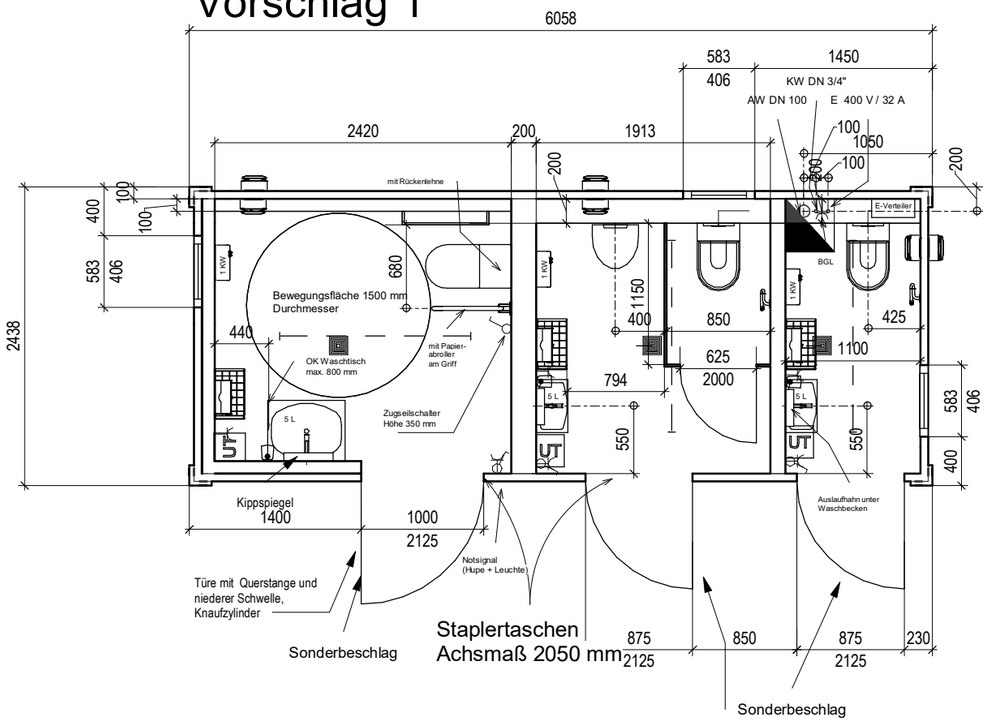

Bodenisolierung 100 mm Mineralwolle
Einstiegshöhe von UK Rahmen bis OKFFB 246 mm

Außenwandisolierung 50 mm Mineralwolle
Dachisolierung 60 mm PU-Element

Sanitärinstallation unterputz (Vorwand)
Frischwasserleitungen Edelstahl

Bodenplatte 2x12 mm Birke Multiplexplatte (keine Türschwelle)

PVC Noppenbelag 2,5 mm R 10 als Wanne verlegt Fb. 901

Warmwasserbereitung über 5 Liter UT Speicher

IR Mischbatterien mit Hygienespülung batteriebetrieben

Lackierung Container und Türen außen in
RAL Farbe gem. Baubeschreibung

Fenstergröße 583x406 mm


Alle Fenster gem. Baubeschreibung,
innen und außen in Farbe weiss

Leuchtmittel LED

E-Verteiler mit Schloß

alle Außentüren mit Panikfunktion und "Doppelzylinder"


Fundamentplan

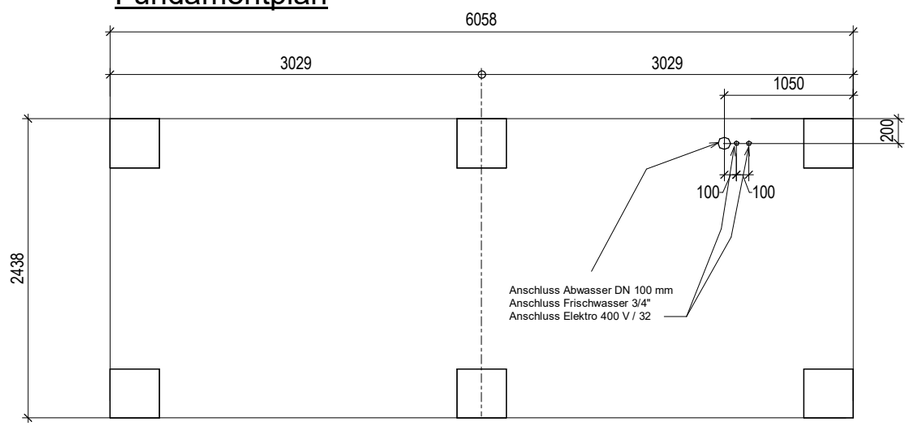



Besonders zu beachten: Fundamenttiefe = Frosttiefe, Bodenanpressung mind. 200KN/qm DIN 1054
Betongüte mind. B25. Mindestbreite von Streifen-, Punktfundamenten: siehe Zeichnung


Zuleitungen aller Art nicht fest einbauen
Zum Anschliessen müssen sie beweglich sein
Leitungen in Leerrohre legen
Frostsicherheit bei Frischwasserleitungen beachten
ggf. Begleitheizung vorsehen

Index	Datum	Änderung	Name	Datum	Maßstab
					1 : 50
				Zeichnungsnummer	Blatt 010
				Gez.	Gepr. Prüfer

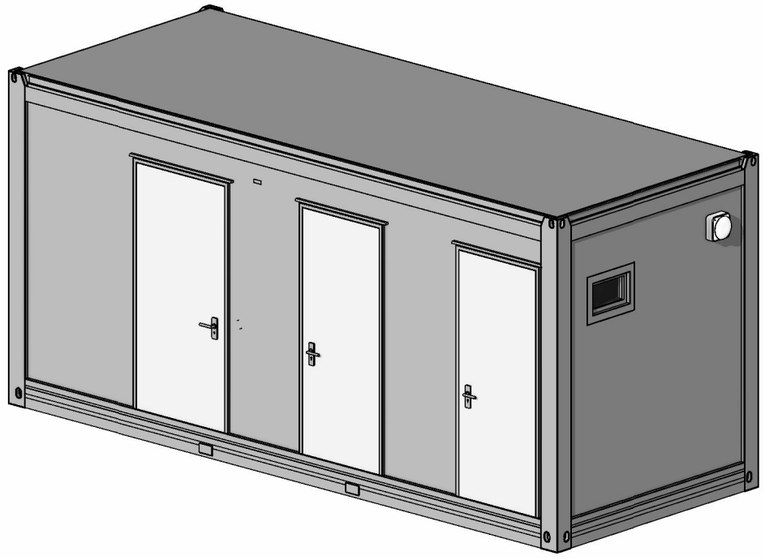

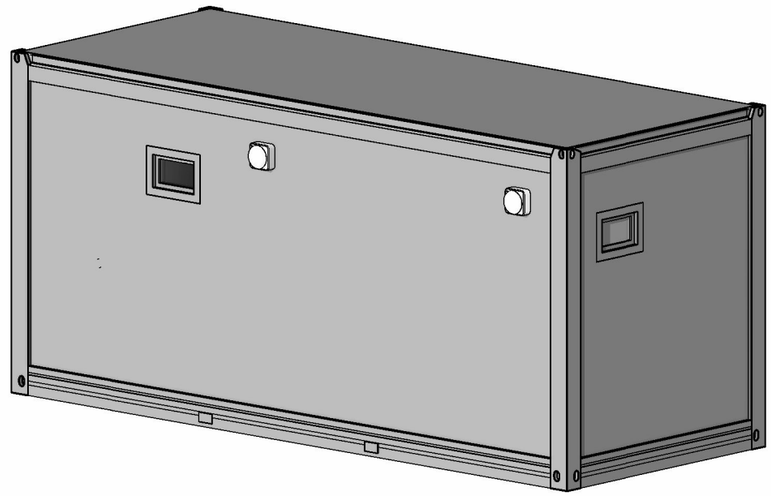

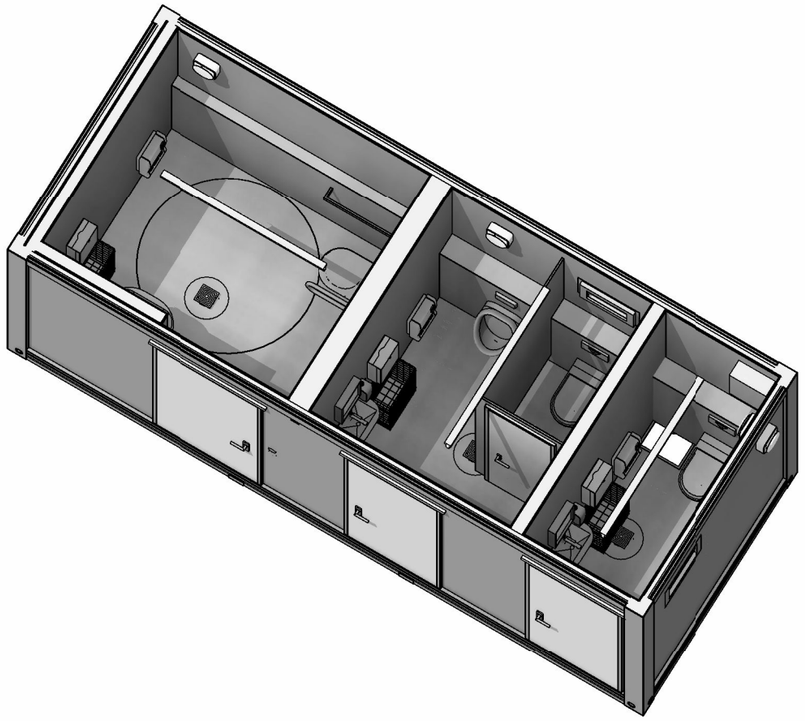

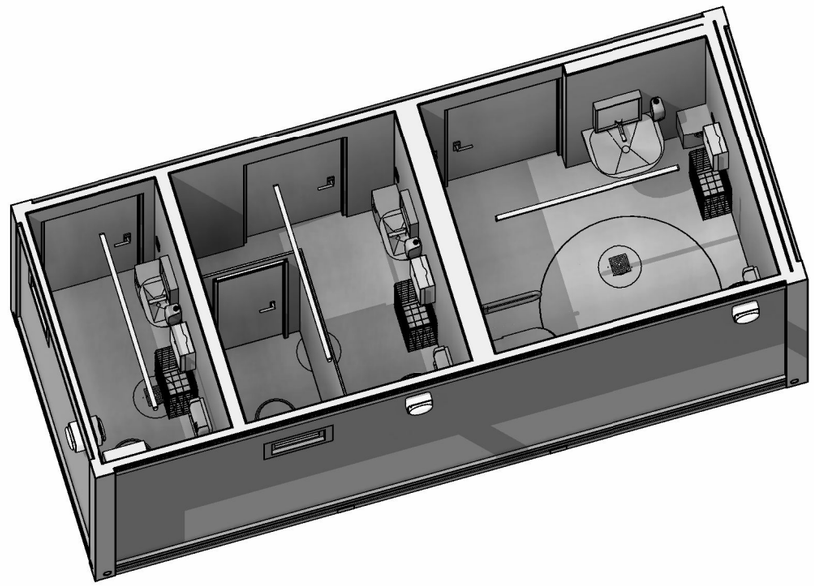

Index	Datum	Änderung	Name	Datum	Maßstab
				06.09.2024	
				Zeichnungsnummer	Blatt
				240906/h31	013
				Gez hk	Gepr Prüfer
